

## 建設工事の進捗状況

ここでは、工事の進捗状況についてお知らせします。

現在、解体工事を行っており、進捗状況と工事予定は次のとおりです。

なお、プラント及び建築工事については現在実施設計中です。工事着手予定は、建築工事については平成 22 年 7 月、プラント工事については平成 23 年 2 月となっています。

### 平成 21 年 3 月の進捗状況



解体工事に必要な事前調査を行います。

写真は、既存焼却施設の現状です。

## 建設工事の進捗状況

ここでは、工事の進捗状況についてお知らせします。  
現在、解体工事を行っており、進捗状況と工事予定は次のとおりです。  
なお、プラント及び建築工事については現在実施設計中です。工事着手予定は、建築工事については平成22年7月、プラント工事については平成23年2月となっています。

### 平成21年4月の進捗状況

主な工事進捗状況は次のとおりです。  
解体工事に必要な事前調査の実施  
破碎選別施設のうち機械選別棟の解体工事

既存焼却施設（西側より）



既存焼却施設及び破碎選別施設（東側より）



事前調査（焼却炉内残留物）



破碎選別施設の一部（機械選別棟）解体



## 建設工事の進捗状況

ここでは、工事の進捗状況についてお知らせします。  
現在、解体工事を行っており、進捗状況と工事予定は次のとおりです。  
なお、プラント及び建築工事については現在実施設計中です。工事着手予定は、建築工事については平成22年7月、プラント工事については平成23年2月となっています。

### 平成21年5月の進捗状況

主な工事進捗状況は次のとおりです。

- 解体工事に必要な事前調査の実施
- 破碎選別施設のうち機械選別棟の解体終了
- 解体工事に必要な仮設の排水処理装置の設置

既存焼却施設(西側より)



既存焼却施設及び破碎選別施設(東側より)



事前調査(水質調査)



機械選別棟解体



## 建設工事の進捗状況

ここでは、工事の進捗状況についてお知らせします。  
現在、解体工事を行っており、進捗状況と工事予定は次のとおりです。  
なお、プラント及び建築工事については現在実施設計中です。工事着手予定は、建築工事については平成22年7月、プラント工事については平成23年2月となっています。

### 平成21年6月の進捗状況

主な工事進捗状況は次のとおりです。

解体工事に必要な仮設排水処理装置の設置、施設内の残留水の排水に着手  
焼却施設残留物の撤去(消石灰サイロからの消石灰抜き取り)

既存焼却施設(西側より)



既存焼却施設及び破碎選別施設(東側より)



残留水の仮設排水処理装置の設置



消石灰サイロからの消石灰抜き取り



## 建設工事の進捗状況

ここでは、工事の進捗状況についてお知らせします。  
現在、解体工事を行っており、進捗状況と工事予定は次のとおりです。  
なお、プラント及び建築工事については現在実施設計中です。工事着手予定は、建築工事については平成22年7月、プラント工事については平成23年2月となっています。

### 平成21年7月の進捗状況

主な工事進捗状況は次のとおりです。

- 焼却棟解体工事に必要な建物の密閉養生
- 仮設の集塵装置、除染水を再利用するための水処理装置の設置
- 灯油タンク本体及びタンク室の解体工事实施

既存焼却施設(西側より)



既存焼却施設及び破碎選別施設(東側より)



焼却棟建物の密閉養生、仮設集塵装置の設置



仮設水処理装置(除染水再利用)の設置





## 建設工事の進捗状況

ここでは、工事の進捗状況についてお知らせします。  
現在、解体工事を行っており、進捗状況と工事予定は次のとおりです。  
なお、プラント及び建築工事については現在実施設計中です。工事着手予定は、建築工事については平成22年7月、プラント工事については平成23年2月となっています。

### 平成21年8月の進捗状況

主な工事進捗状況は次のとおりです。

電気集塵器置き場に仮設屋根を設け密閉化

汚水処理棟の解体

破碎選別施設のうち破碎棟の解体工事に着手

焼却棟除染工事(焼却棟内に残留するダイオキシン類を除去する工事)に着手

既存焼却施設(西側より)



既存焼却施設及び破碎選別施設(東側より)



電気集じん器置き場の密閉化



破碎棟解体工事



焼却棟除染工事(電気集じん器内部除染工事)



## 建設工事の進捗状況

ここでは、工事の進捗状況についてお知らせします。

現在、解体工事を行っており、進捗状況と工事予定は次のとおりです。

なお、プラント及び建築工事については現在実施設計中です。工事着手予定は、建築工事については平成22年7月、プラント工事については平成23年2月となっています。

### 平成21年9月の進捗状況

主な工事進捗状況は次のとおりです。

破砕選別施設の解体工事が概ね終了

焼却棟除染工事(焼却棟内に残留するダイオキシン類を除去する工事)が終了


焼却棟解体のための建物周囲の仮囲い、重機出入口を設置

汚水処理棟、蒸気分配棟を解体

既存焼却施設(西側より)



既存焼却施設(東側より)

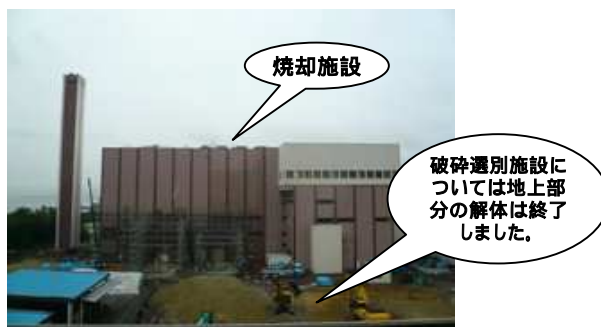

焼却炉内除染工事



焼却棟建物周囲仮囲い工事



焼却棟に重機出入口を設置



「特集 破砕棟解体工事の進め方について」もご覧ください。

## 特集 破碎棟解体工事の進め方について

破碎棟解体は、平成21年8月3日より着手し、9月14日現在地上部分の解体がほぼ終了しました。

破碎棟解体工事着手前状況



手選別室を解体しています。



ごみクレーン及び破碎機を解体しています。



ごみクレーン解体状況



破碎機解体状況



地上部分の解体がほぼ終了しました。引き続き地中部分の基礎などを撤去します。





## 建設工事の進捗状況

ここでは、工事の進捗状況についてお知らせします。

現在、解体工事を行っており、進捗状況と工事予定は次のとおりです。

なお、プラント及び建築工事については現在実施設計中です。工事着手予定は、建築工事については平成22年7月、プラント工事については平成23年2月となっています。

### 平成21年10月の進捗状況

主な工事進捗状況は次のとおりです。

煙突解体のための足場設置

焼却棟建物解体に着手(ランブウェイ解体)

焼却炉本体、ボイラの耐火物解体


電気集じん器等排ガス処理装置の解体

破砕選別施設の地下部分の基礎等の解体に着手

既存焼却施設(西側より)



既存焼却施設(東側より)

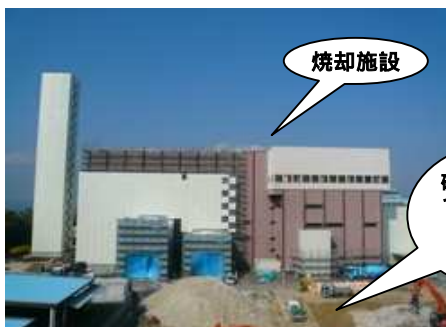

煙突解体のための足場設置



ランブウェイ解体



焼却炉耐火物解体



破砕選別施設地下部分解体



## 建設工事の進捗状況

ここでは、工事の進捗状況についてお知らせします。

現在、解体工事を行っており、進捗状況と工事予定は次のとおりです。

なお、プラント及び建築工事については現在実施設計中です。工事着手予定は、建築工事については平成22年7月、プラント工事については平成23年2月となっています。

平成21年11月の進捗状況

主な工事進捗状況は次のとおりです。

焼却棟建物を引き続き解体

焼却炉本体、ボイラを引き続き解体

電気集じん器等排ガス処理装置を引き続き解体

煙突解体に着手

破砕選別施設の地下部分の基礎等の解体

既存焼却施設(西側より)



焼却棟建物解体 (プラントホーム解体)



煙突解体1



煙突外筒のコンクリート躯体を切断しながら解体しています。

既存焼却施設(東側より)



焼却施設

破砕選別施設については整地を除き解体は終了しました。

破砕選別施設地下部解体



煙突解体2



煙突(高さ59.5m)を解体するためのクローラクレーンを据付けています。

## 建設工事の進捗状況

ここでは、工事の進捗状況についてお知らせします。

現在、解体工事を行っており、進捗状況と工事予定は次のとおりです。

なお、プラント及び建築工事については現在実施設計中です。工事着手予定は、建築工事については平成22年7月、プラント工事については平成23年2月となっています。

平成21年12月の進捗状況

主な工事進捗状況は次のとおりです。

焼却棟建物を引き続き解体

焼却炉本体、ボイラを引き続き解体

ごみクレーンを解体

電気集じん器等排ガス処理装置を引き続き解体

煙突を引き続き解体

破碎選別施設解体後の整地

既存焼却施設(西側より)



既存焼却施設(東側より)



電気集じん器解体



ごみクレーン解体



破碎選別施設解体後整地



煙突解体



煙突(高さ59.5m)内筒を切断しながら撤去しています。写真は、約42mまで解体が進んでいます。



## 建設工事の進捗状況

ここでは、工事の進捗状況についてお知らせします。  
現在、解体工事を行っており、進捗状況と工事予定は次のとおりです。  
なお、プラント及び建築工事については現在実施設計中です。工事着手予定は、建築工事については平成22年7月、プラント工事については平成23年2月となっています。

### 平成22年1月の進捗状況

主な工事進捗状況は次のとおりです。

- ごみクレーンの解体が終了
- プラントホームの解体が終了しごみピット解体に着手
- 焼却炉本体、ボイラを引き続き解体
- 煙突を引き続き解体
- 破碎選別施設跡地の整地が終了

既存焼却施設(西側より)



既存焼却施設(東側より)



ごみピット躯体解体



ごみピット上家解体



プラント機器撤去(非常用発電機)



煙突解体



高さ59.5mの煙突は残り約15mまで解体が進んでいます。



## 建設工事の進捗状況

ここでは、工事の進捗状況についてお知らせします。  
現在、解体工事を行っており、進捗状況と工事予定は次のとおりです。  
なお、プラント及び建築工事については現在実施設計中です。工事着手予定は、建築工事については平成22年7月、プラント工事については平成23年2月となっています。


### 平成22年2月の進捗状況

主な工事進捗状況は次のとおりです。


ごみピット、灰ピット部分を引き続き解体

焼却炉本体ほかプラント機器の解体撤去が終了し、炉室、集塵機ヤード部分の解体に着手

既存焼却施設(西側より)

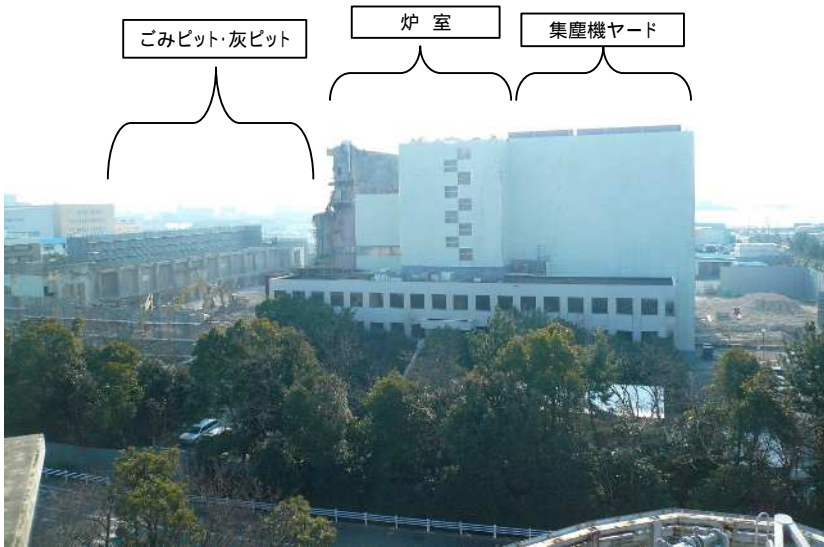

既存焼却施設(東側より)

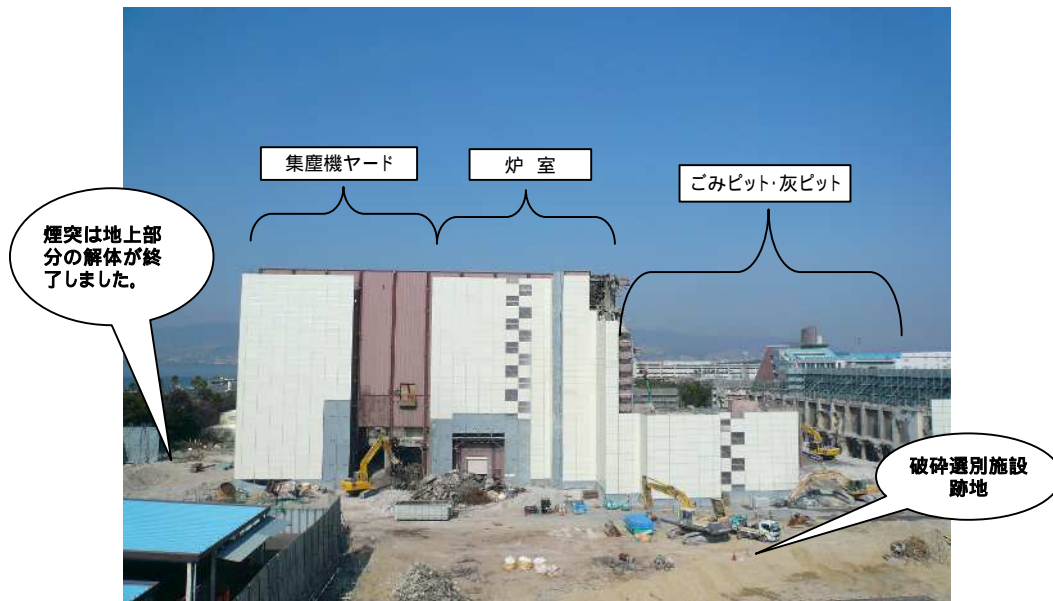

## 建設工事の進捗状況

ここでは、工事の進捗状況についてお知らせします。  
現在、解体工事を行っており、進捗状況と工事予定は次のとおりです。  
なお、プラント及び建築工事については現在実施設計中です。工事着手予定は、建築工事については平成22年7月、プラント工事については平成23年2月となっています。

### 平成22年3月の進捗状況

主な工事進捗状況は次のとおりです。  
焼却棟建物を引き続き解体し、地上部分について概ね終了

既存施設跡地(西側より)



既存施設跡地(東側より)

ペットボトル圧縮  
保管施設は稼働し  
ています。



## 建設工事の進捗状況

ここでは、工事の進捗状況についてお知らせします。  
現在、解体工事を行っており、進捗状況と工事予定は次のとおりです。  
なお、プラント及び建築工事については現在実施設計中です。工事着手予定は、建築工事については平成22年7月、プラント工事については平成23年2月となっています。

### 平成22年4月の進捗状況

主な工事進捗状況は次のとおりです。  
焼却棟建物について地下部分の躯体を解体中  
計量棟の解体に着手

既存施設跡地(西側より)



既存施設跡地(東側より)

ペットボトル圧縮  
保管施設は稼働し  
ています。



## 建設工事の進捗状況

ここでは、工事の進捗状況についてお知らせします。  
現在、解体工事を行っており、進捗状況と工事予定は次のとおりです。  
なお、プラント及び建築工事については現在実施設計中です。工事着手予定は、建築工事については平成22年7月、プラント工事については平成23年2月となっています。

### 平成22年5月の進捗状況

主な工事進捗状況は次のとおりです。  
焼却棟建物について地下部分の躯体解体が終了、場内整地に着手  
計量棟の解体が終了し、アスファルト舗装を実施  
雨水貯槽、灯油タンク室の解体に着手  
解体工事後の事後調査を実施

既存施設跡地(西側より)



既存施設跡地(東側より)



計量棟解体後跡地舗装





## 建設工事の進捗状況

ここでは、工事の進捗状況についてお知らせします。

平成20年3月に着手した解体工事は平成22年6月に終了し、7月より建築工事に着手する予定です。  
なお、プラント工事の着手予定は平成23年2月となっています。

平成22年6月の進捗状況

主な工事進捗状況は次のとおりです。

既存建物解体後跡地を整地  
解体工事後の事後調査を実施

既存施設跡地(西側より)



既存施設跡地(東側より)



事後調査(土壌調査)



事後調査(雨水放流先水質調査)

