

# 瓦木中学校 R3年度 夏休み先行改修工事におけるアスベスト除去工事

## 気中濃度測定結果

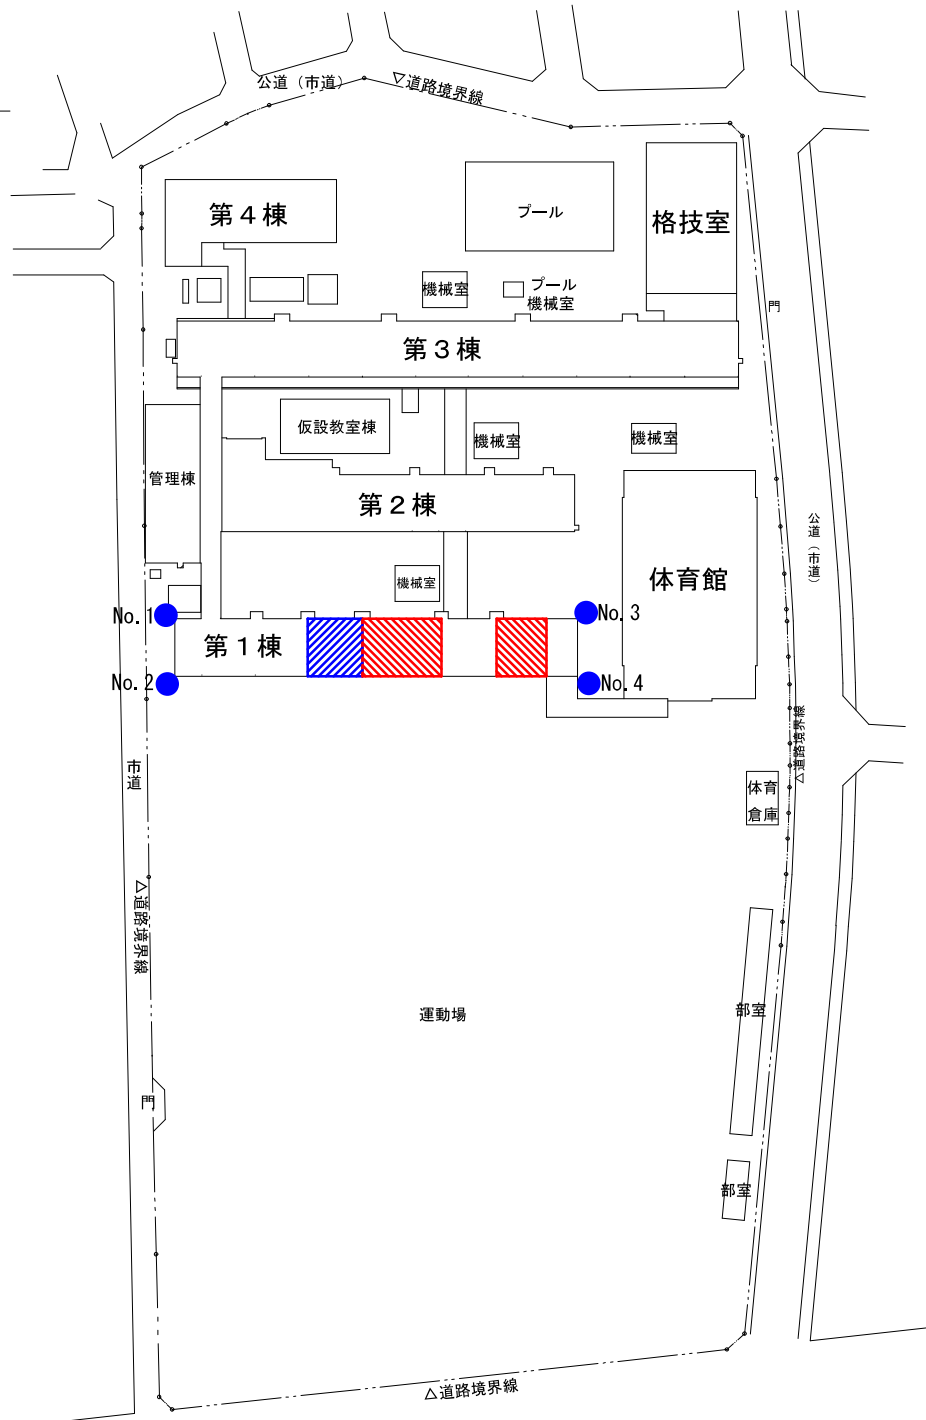

アスベスト除去作業に際して実施しました大気中の粉じん濃度測定結果につきましては、下記の通りとなっております。

- 環境省が【アスベストモニタリングマニュアル（第4.1版）】で目安としている数値『空気1ℓに対して総繊維数が1本以下（1本/ℓ）』を基準とします。
- アスベストと類似した繊維も計測されるため、本調査では「総繊維数濃度」として結果を公表しています。「総繊維数濃度」が1本/ℓを超えた場合、検出された繊維がアスベストかを分析します。
- NDとは、検出可能な最小数値(0.056本/ℓ)未満のことです。
- 測定箇所については別添の「気中濃度測定箇所」をご確認ください。




測定日	測定箇所 総繊維数濃度（単位：本/ℓ）				施工状況	
	No.1	No.2	No.3	No.4	第1区画	第2区画
令和3年7月22日	ND	ND	ND	ND	施工前	施工前
令和3年7月28日	ND	ND	ND	ND	施工中	施工前
令和3年7月30日	ND	ND	ND	ND	施工完了時	施工前
令和3年8月3日	ND	ND	ND	ND	—	施工中
令和3年8月4日	ND	ND	ND	ND	—	施工完了時

### 【問い合わせ先】

- ・アスベストの除去工事に関すること  
西宮市土木局営繕部営繕課  
森崎・松矢 電話0798-35-3706
- ・事業全体に関すること  
西宮市教育委員会教育総括室学校施設計画課  
二軒谷・伊東 電話0798-35-3828



### 凡例

-  第1区画：石綿除去作業範囲
-  第2区画：石綿除去作業範囲
-  気中濃度測定箇所

瓦木中学校 R3年度 夏休み先行改修工事における  
アスベスト 除去工事 気中濃度測定箇所図
