

春風小学校校舎改築工事に係る工事請負変更契約締結に関する意見決定の件

春風小学校校舎改築工事に係る工事請負変更契約を締結するにあたり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第29条の規定に基づき、提示すべき意見を別紙のように決定する。

令和2年11月11日提出

西宮市教育委員会
教育長 重松 司郎

別紙

春風小学校校舎改築工事に係る工事請負変更契約締結に関する意見

春風小学校校舎改築工事に係る工事請負変更契約を締結することについて、異議はありません。

令和2年11月11日

西宮市教育委員会
教育長 重松 司郎

工事請負契約変更の件

令和元年12月18日議決を得た工事請負契約変更の件中、契約金額を下記のとおり変更する。

令和2年11月27日提出

西宮市長 石井 登志郎

記

議 決 番 号	変 更 事 項
議決第131号	契約金額「金2,687,840,180円」を「金2,722,418,817円」に変更する。

(参考)

- 1 変更理由 設計当初想定していなかった地下湧水の処理及び地中障害の撤去処分に伴う変更等により、工事費を増額する必要性が生じたため。
- 2 原契約の目的 春風小学校校舎改築工事
- 3 契約の相手方 西宮市池田町12番20号
新井組・安武建設 特定建設工事共同企業体
- 4 工 期 令和元年7月9日から令和4年3月31日まで

(議案第 4 号)



工事請負契約変更の件 (春風小学校校舎改築工事)

令和2年12月定例会 教育こども常任委員会
議案資料
令和2年12月10日

※委員会日までは外部への
資料提供はご遠慮ください。

教育委員会 教育総括室 学校施設計画課
土木局 営繕部 営繕課

全体配置図・付近見取図


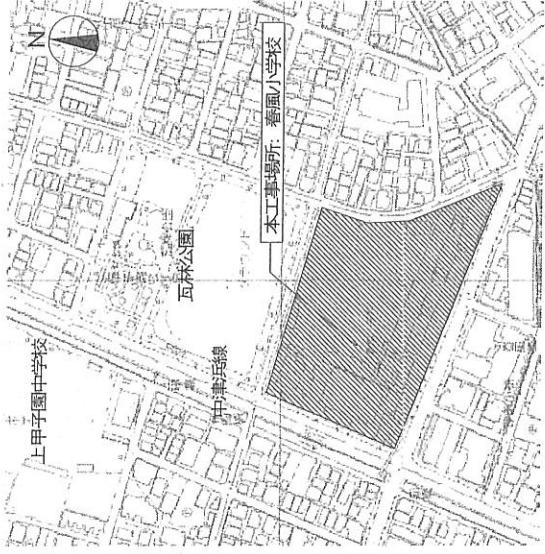
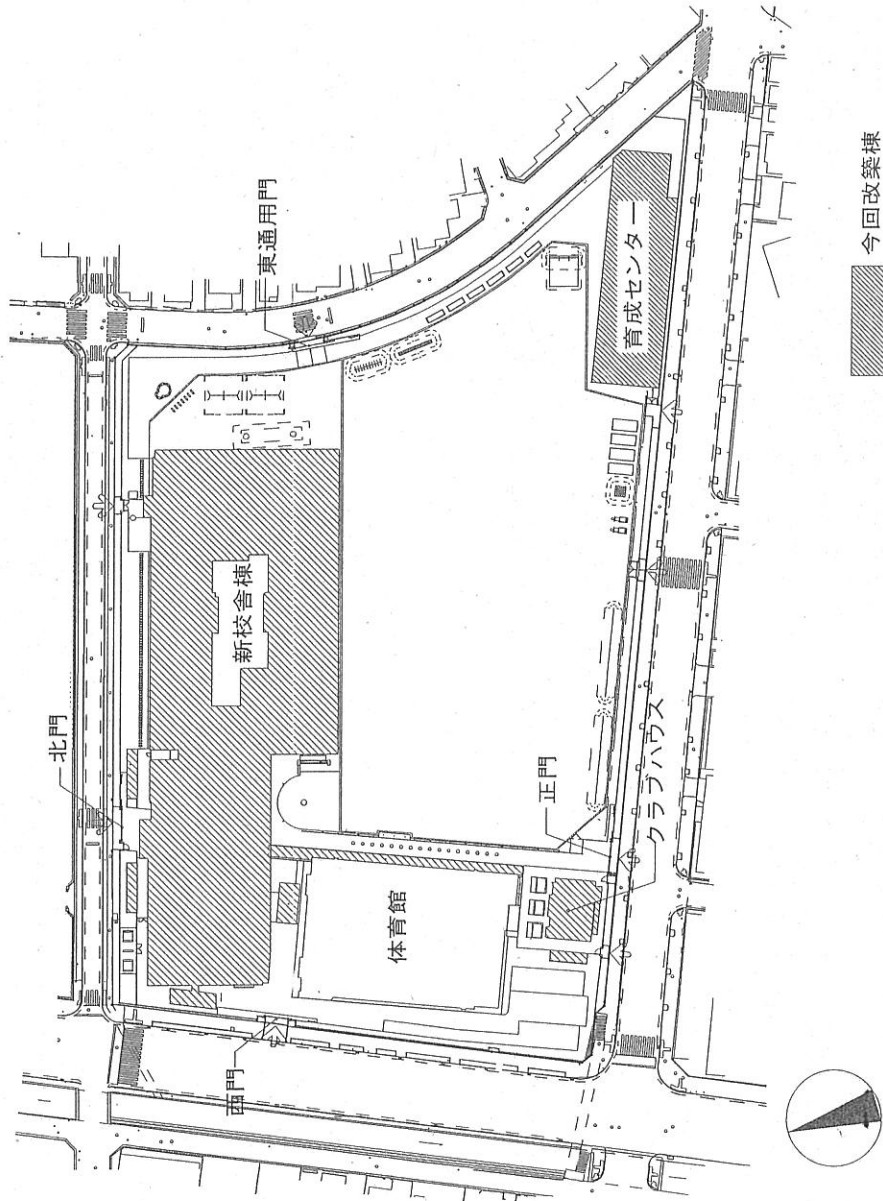


本工事場所： 西宮市上甲子園3丁目89番、105番2

工事概要

工種	数量
① 地下湧水処理 ・ 土留め ・ 排水管等	約280m 約450m
② 地中障害撤去処分	約15m ³
③ その他 ・ 受水槽基礎変更 ・ 玄関水一ル床仕上げ変更 ・ 手すり変更 ・ 木部塗装変更 等	

①地下湧水処理(工事概要説明図)

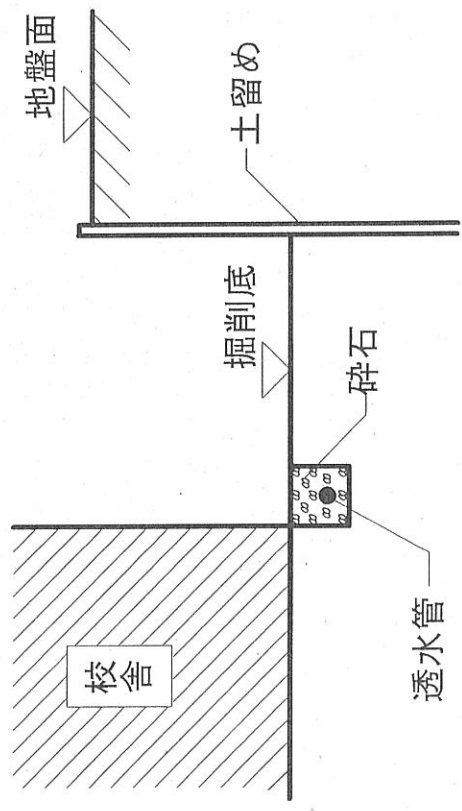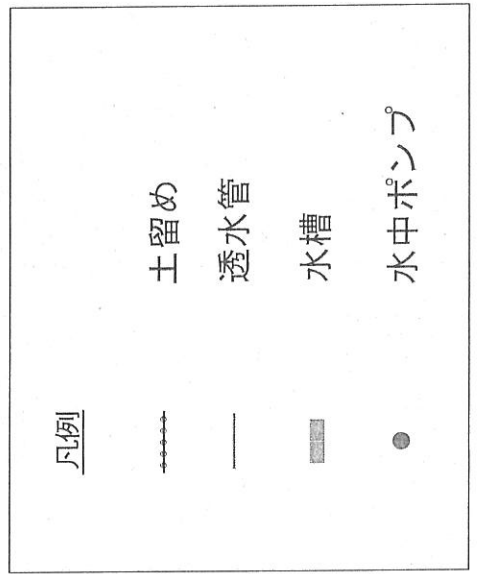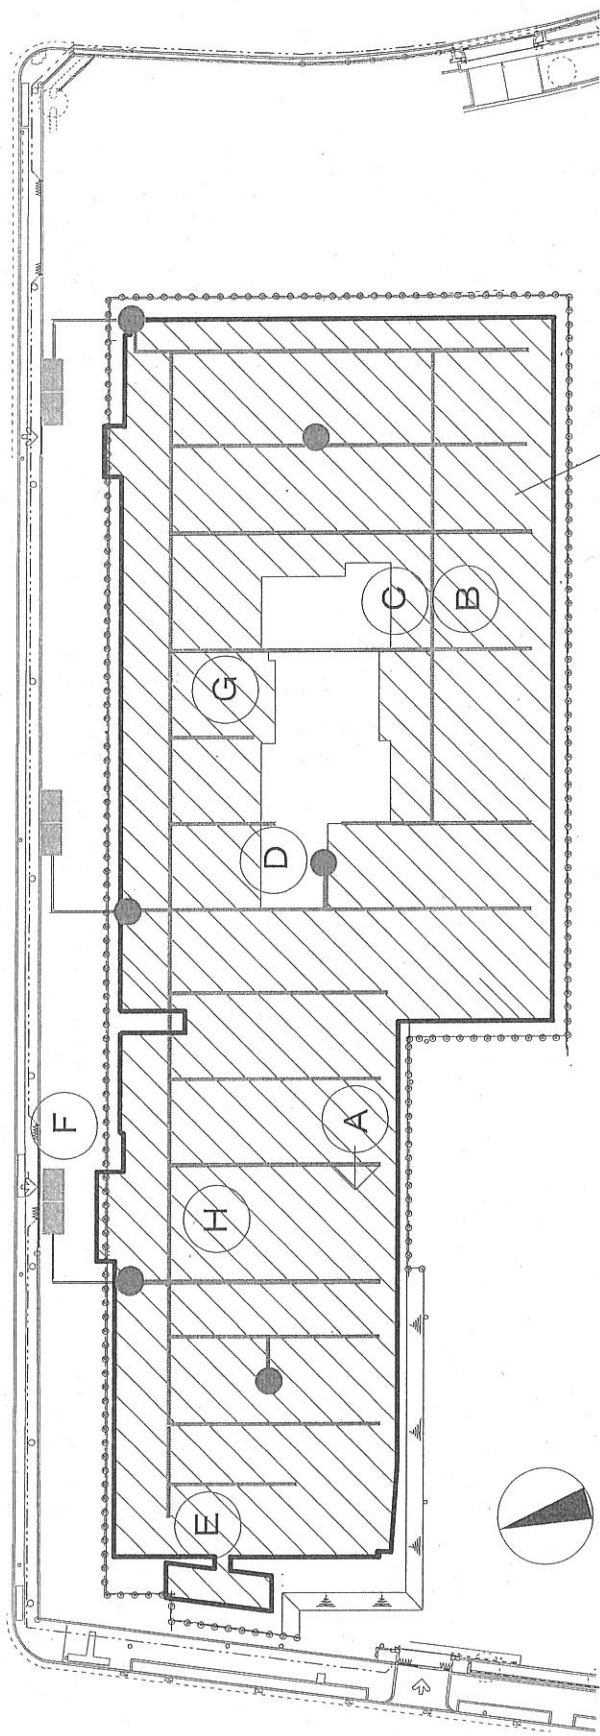


①-1 地下湧水処理(現場状況)


A 全景




B 透水管埋設状況

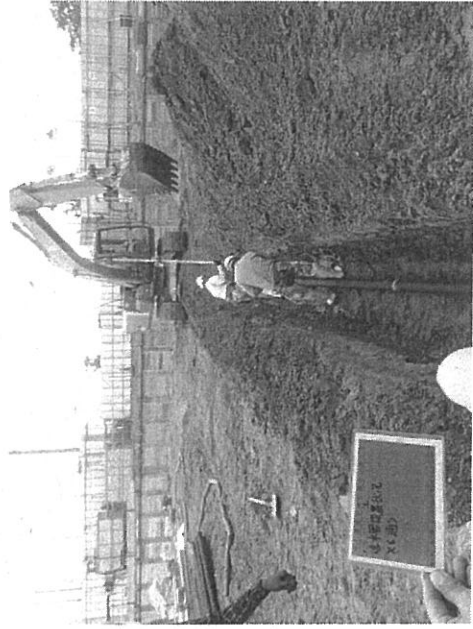

C 透水管設置状況

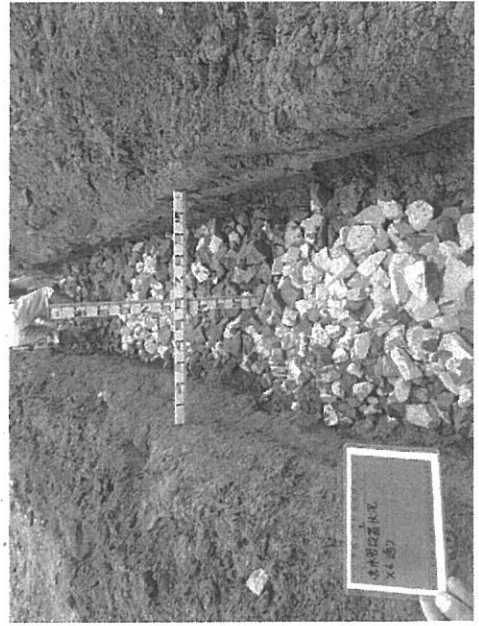

D 水中ポンプ設置状況

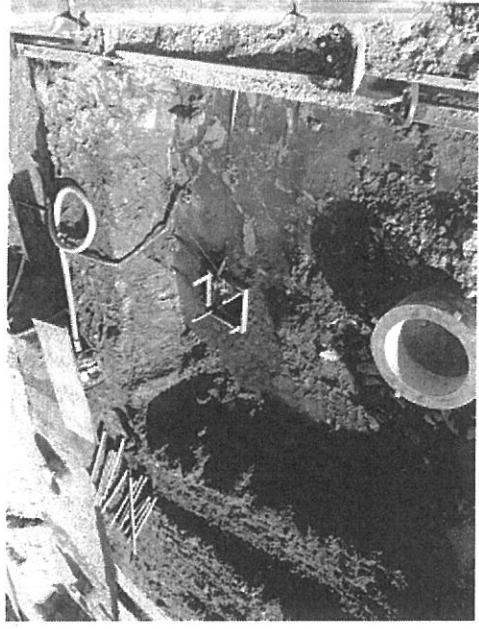


①-2 地下湧水処理(現場状況)


E 土留め設置状況




F 水槽設置 排水状況

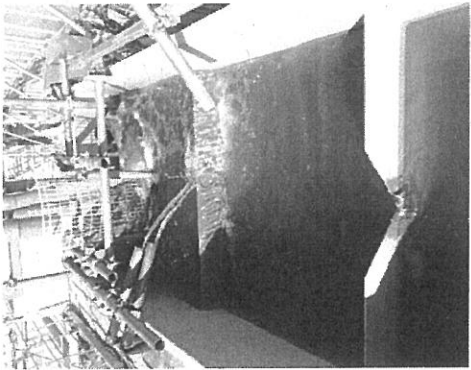


G 湧水処理前の状況

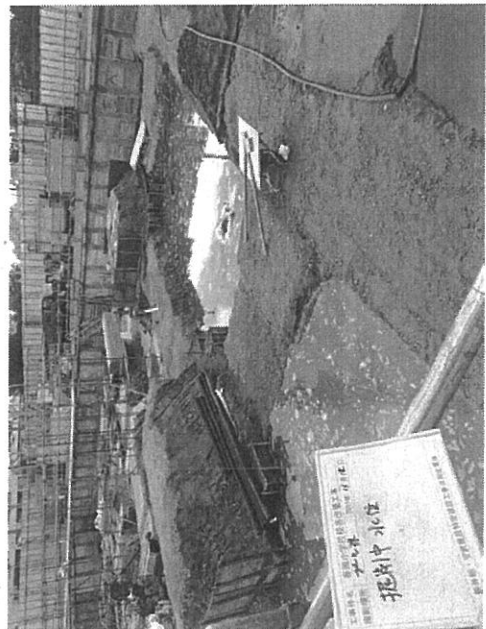

H 湧水処理後の状況

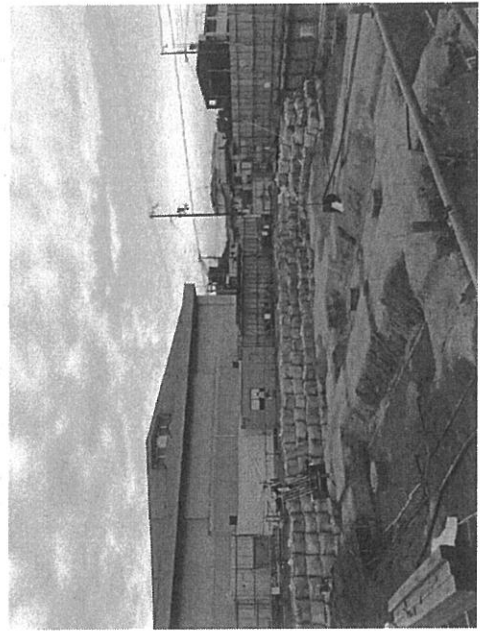

②地中障害撤去処分(工事概要説明図)

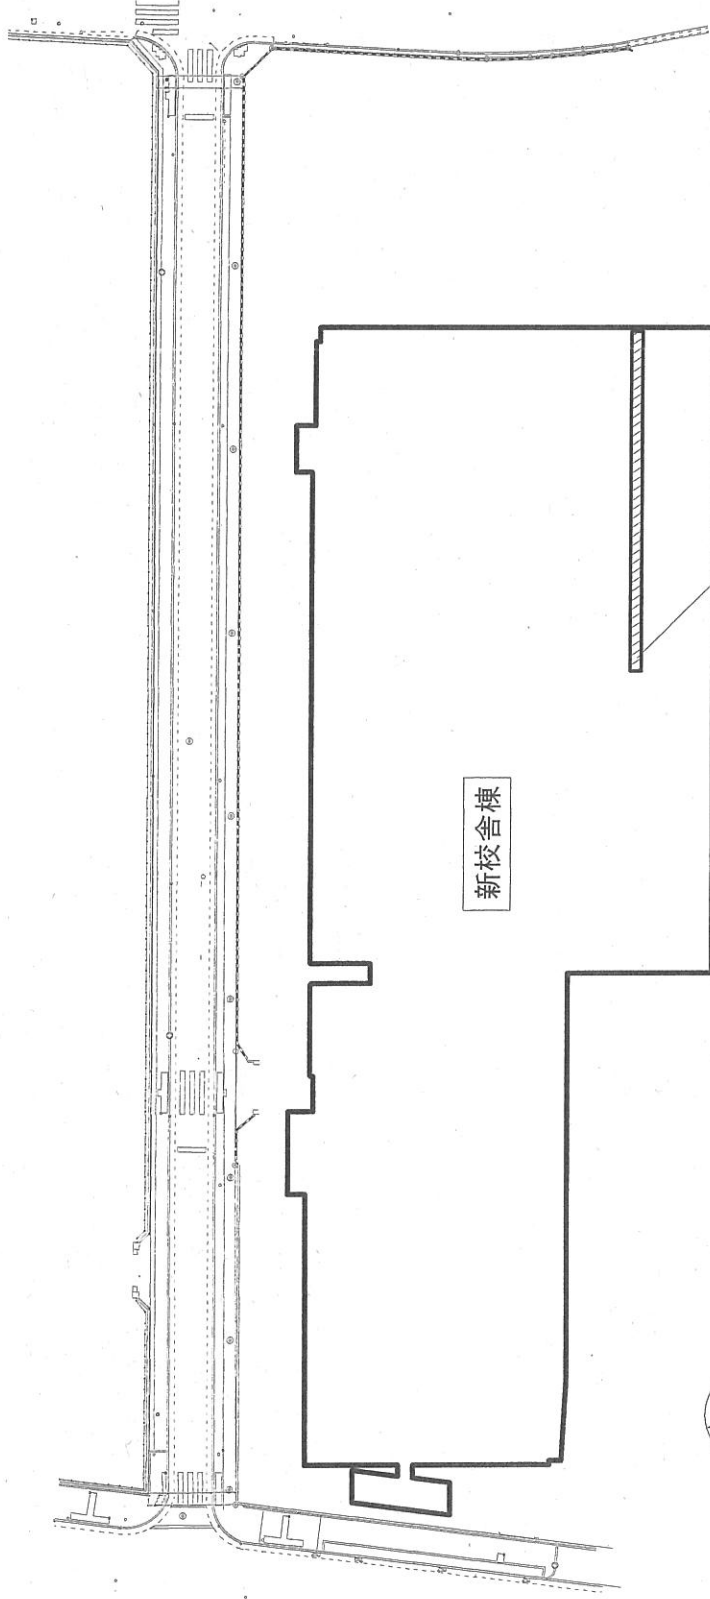

地中障害(間伐石)
巾 0.6m、高さ 1.0m、長さ 31.5m

② 地中障害撤去処分(現場状況)

A 散石埋没状況



B 掘削状況



C 集積状況



D 積込状況

